

INFORME SEMANAL DE TAREAS

SEMANA DEL 20 al 26 de ENERO



DIRECCIÓN DE
OBRAS RURALES



OLAVARRÍA
MUNICIPIO

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las tareas que se realizaron en la red vial del partido de Olavarría durante la semana en curso, y también se pueden ver en algunos casos, las tareas programadas para las siguientes semanas.

Se aclara que la mayor parte del cronograma estipulado queda sujeto a variaciones, que pueden ser producto de las condiciones climáticas, rotura o mantenimiento de equipos y/o algún otro factor externo.

Como se viene informando, continua el plan de trabajos que corresponde a alteos de caminos y conformación de cunetas. Con este tipo de tareas se espera que se mejore sustancialmente el escurrimiento del agua, complementando dichas acciones con los dos equipos de reparación y limpieza de alcantarillas que se encuentran en el partido y que también se detallan en el presente informe.

Sobre el fin de esta semana se produjeron las precipitaciones que se esperaban, rondando los 15/20 mm en promedio en el partido, lo que nos permite trabajar sobre algunos entoscados que se irán detallando por zona.



MOTONIVELADORA 2: Esta semana se terminaron las tareas en el camino 78-2-64 a (Camino de Urdampilleta). Se trasladaron al lugar tubos para reparar alcantarillas dañadas, las cuales serán materializadas la semana próxima, y material de aporte para garantizar estabilidad en las tapadas. Además, se realizaron tareas de reconfirmado en el camino 078-15 (Recalde – Paula). Actualmente el equipo se trasladó al camino 78-2-58 (Modarelli) donde se iniciaron tareas de alteo y conformado de cunetas. Dependiendo de las precipitaciones previstas se ira avanzando en la zona conforme al cronograma. Se espera poder intervenir los entoscados de la zona, tanto Recalde – Iturregui como Recalde – Mápis.



OBRA BLANCA GRANDE – RECALDE:

La última semana del año pasado se dio inicio a una obra de bacheo sobre la traza del camino 078-13, más precisamente en el tramo Blanca Grande – Recalde (Hasta estancia 15 de octubre). Como se había anunciado, dicha obra se financiará con la metodología de intercambio de horas de equipo, según lo establece el pliego de licitación de mantenimiento vigente.

La idea de esta intervención es poder aportar material en los lugares donde se dificulta la transitabilidad. Si bien entendemos que los días de lluvia y posteriores no se debe circular con ningún tipo de vehículo, según reglamenta la ordenanza municipal 3684/14, ese tramo merecía una intervención ya que es altamente transitado por la comunidad rural en general.

A lo largo de los siguientes informes se irán mostrando avances de la obra. Se espera ir desparramando el material con alguna motoniveladora de mantenimiento.


Esta semana se sumó una batea al equipo de trabajo, la cual apporto material en los lugares donde no había extracción lateral, y además se realizó un bacheo en algunos puntos críticos de ese camino, puntualmente entre Blanca Grande y la Ruta Nacional 226. Además, desde la delegación de Espigas, con su propio camión se trasladó tosca para recubrir algunas partes del camino 078-13 (Acceso a Espigas)



ZONA 2

- EMPRESA CONTRATISTA: ANCAT SA

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

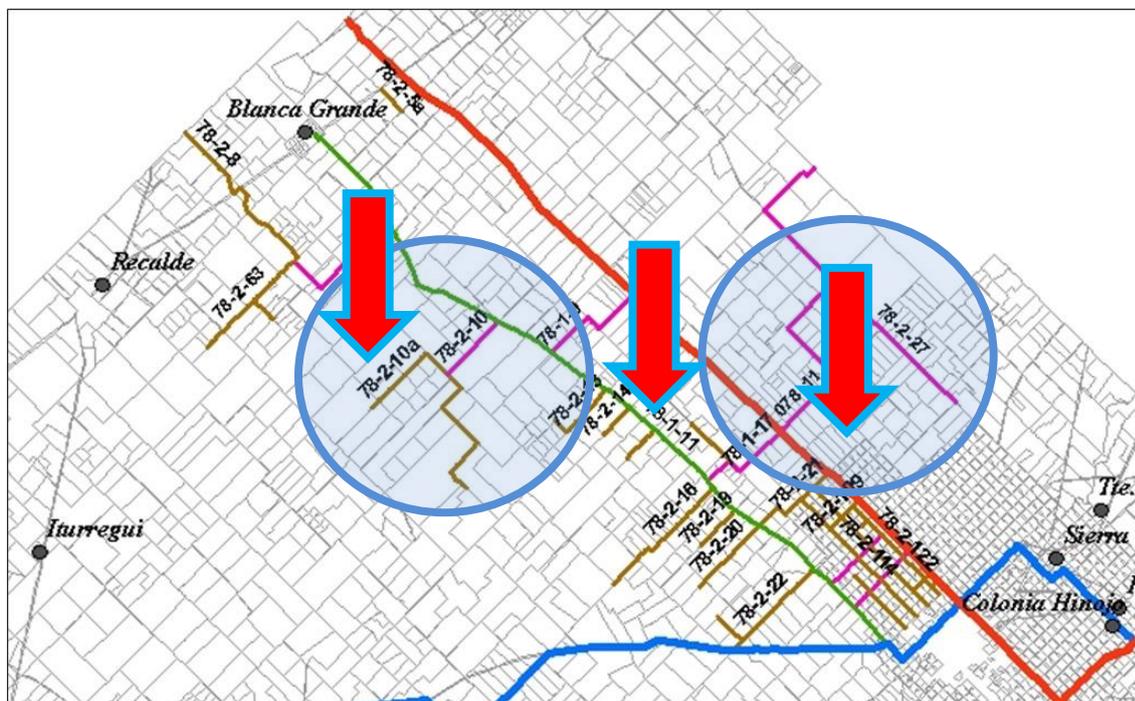


MOTONIVELADORA 1: Esta semana se concluyeron las tareas en el camino 78-2-23a (7 de abril – Alem), donde se limpiaron las cunetas y se alteo la traza del camino. El mismo se vio cortado en varias partes cuando se produjeron fuertes precipitaciones. Además, aprovechando las condiciones de humedad y como estaba previsto en el cronograma, se iniciaron las tareas de aporte de material estabilizado en el camino 078-04 (acceso a crotto).

Si se producen según lo pronosticado algunas precipitaciones para la próxima semana, la intervención del camino se prevé hasta el límite con el partido de Tapalqué.



MOTONIVELADORA 2: Se concluyó la intervención del camino 78-2-10a (al otro lado del parque eólico.) Allí se realizaron tareas de alteo y conformado de cunetas, en la primera recta de la traza. Se espera poder ir avanzando, y en la medida que se produzcan las precipitaciones, intercalar trabajos de alteo con reconformado de entoscados. El día jueves 23/01 se iniciaron tareas de regado y reconformado de un tramo del camino 78-1-11 (Ruta 226 vieja) A la altura de la loma del km 319. Allí se logró recuperar la transitabilidad, y se espera hoy viernes aportar material estabilizado para seguir mejorando las condiciones en el lugar, ya que la extrema sequía que venimos atravesando genera una inestabilidad de la traza, producto de las características propias de ese material. Además, con tanto polvo suspendido en el aire producto del tránsito, se generaba una situación de peligro para los conductores.



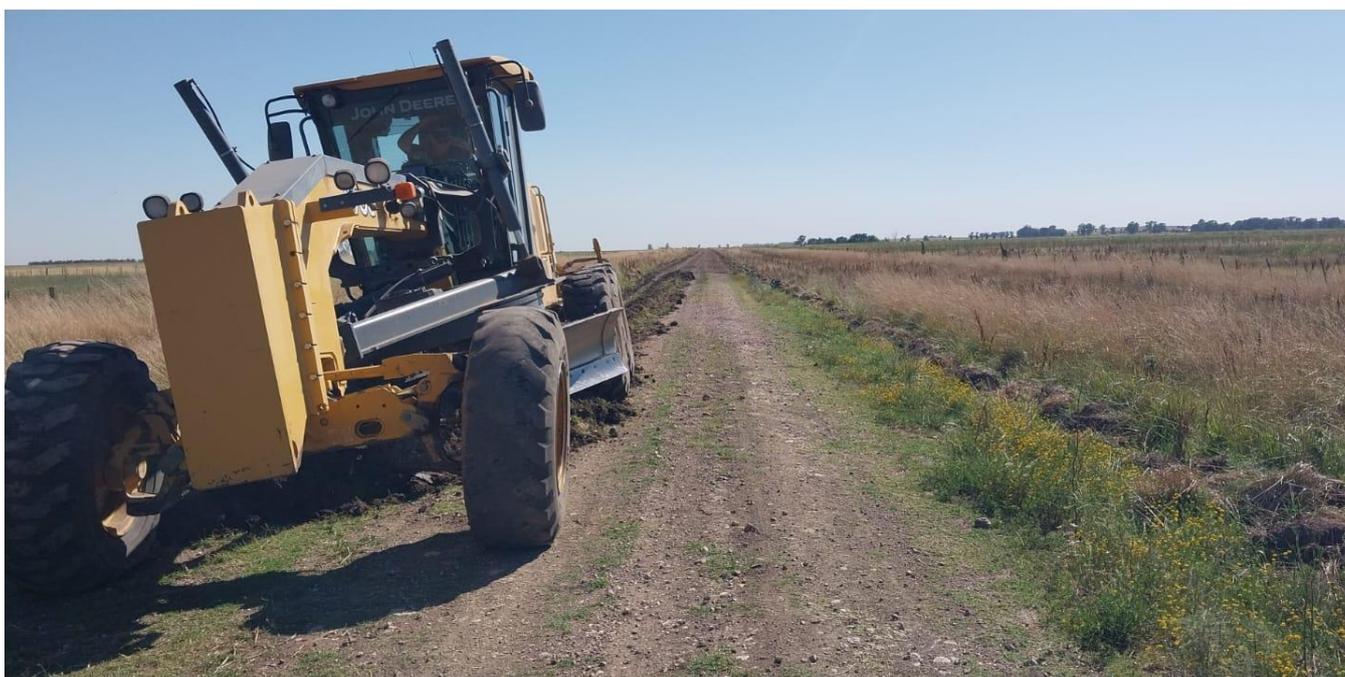

DIRECCIÓN DE
OBRAS RURALES




OLAVARRÍA
MUNICIPIO

ZONA 3

- EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

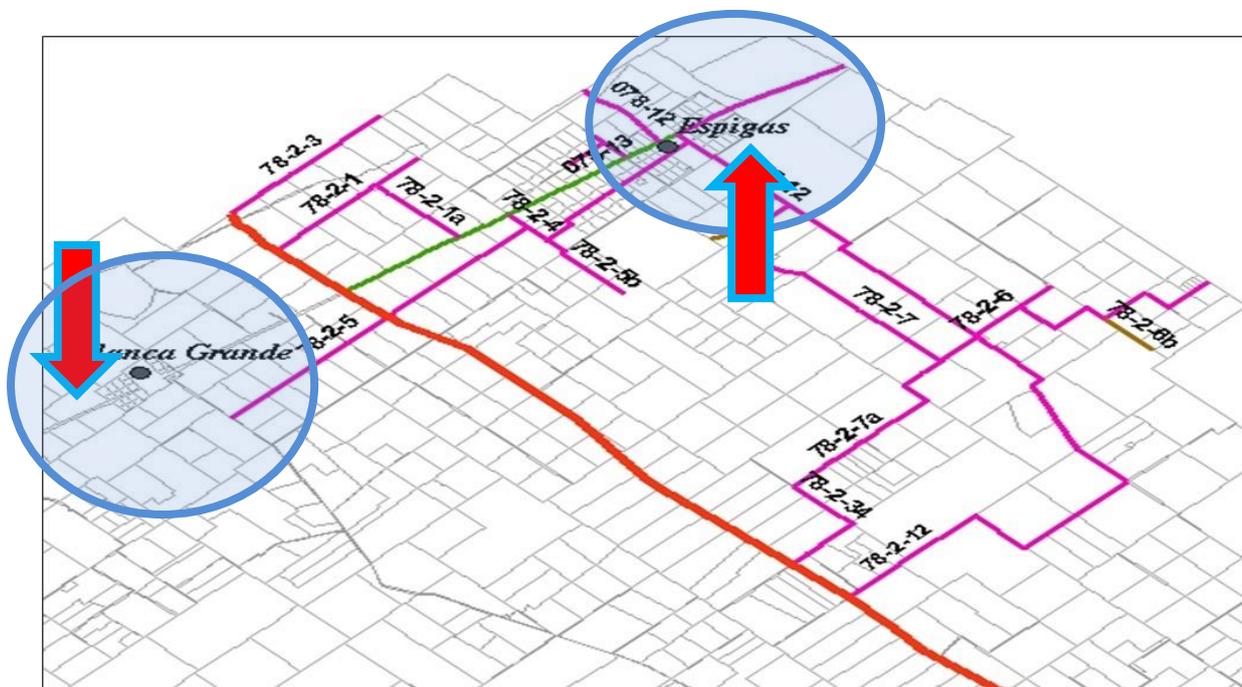

MOTONIVELADORA 1: Este equipo continuo con las tareas en la obra de reentoscado del camino 078-13 (Blanca Grande – Recalde). Dicha obra se detalló en este informe y se espera que continúe hasta la semana próxima. Además, se realizaron tareas de reconformado y limpieza de cunetas en el camino 078-12 (Espigas – Arroyo las flores). Hoy viernes se intervino el camino 078-13 (Acceso a Espigas) aprovechando las precipitaciones de la zona.



MOTONIVELADORA 2: continúan las tareas de alteo previstas para el camino 78-2-163 (Desvío Colonia Hinojo). En el mismo se está realizando la conformación de cunetas, para lograr dar mayor altura a la calzada. Es de destacar que en la zona se encuentra la escuela N° 29, la cual es bastante concurrida, y se habían detectado problemas de transitabilidad en algunos periodos con abundantes precipitaciones. Además, se le aporto material estabilizado en algunos sectores donde se dificultaba la transitabilidad.


Si se producen las precipitaciones anunciadas para el lunes próximo, este equipo se trasladará para el camino 78-1-104 (Frontera Sur), el cual se encuentra con baches y resaltos, pero no se ha podido intervenir por la falta de humedad.



ZONA 4

- ZONA AFECTADA A MANTENIMIENTO CON EQUIPOS MUNICIPALES

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

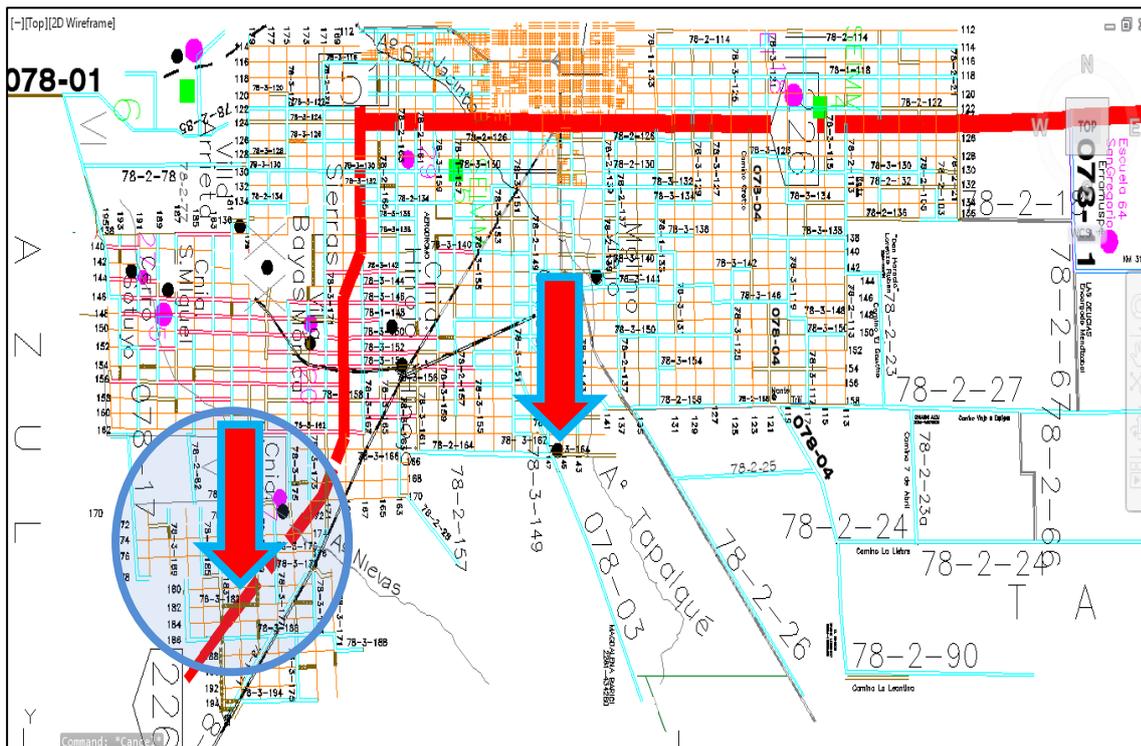

MOTONIVELADORA 1: Esta semana volvió a estar operativo este equipo. Luego de probarlo en inmediaciones de la ciudad se dispuso su traslado a la zona de Colonia Nuevas, donde teníamos tareas iniciadas y se retomaron.

Allí principalmente se están realizando tareas de alteo y estabilizado de caminos, con el aporte de material proveniente de canteras Piatti y trasladados al lugar de la obra por la batea municipal.



RETROEXCAVADORA MUNICIPAL: Este equipo inició tareas de entoscado y formación de cunetas en el camino 78-3-37b (camino a 16 de julio – Zona El Perdido). Se está realizando un importante movimiento de suelo, a fin de garantizar el escurrimiento del agua, y a su vez, la extracción de tosca para mejorar la transitabilidad. Además, se realizaron tareas de desmonte en una zona donde las plantas impedían el escurrimiento del agua.


La zona es altamente transitada, y tuvo varias complicaciones en el primer parte del año donde las precipitaciones fueron abundantes. Se espera poder conectar este tramo de camino con el entoscado perteneciente a Benito Juárez, y lograr mejorar la conectividad de esa zona con la localidad de 16 de Julio. En la medida que la obra avance se irán mostrando imágenes y comunicando en el presente informe.



ZONA 5

EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES

DISPOSICION DE EQUIPOR POR ZONA:

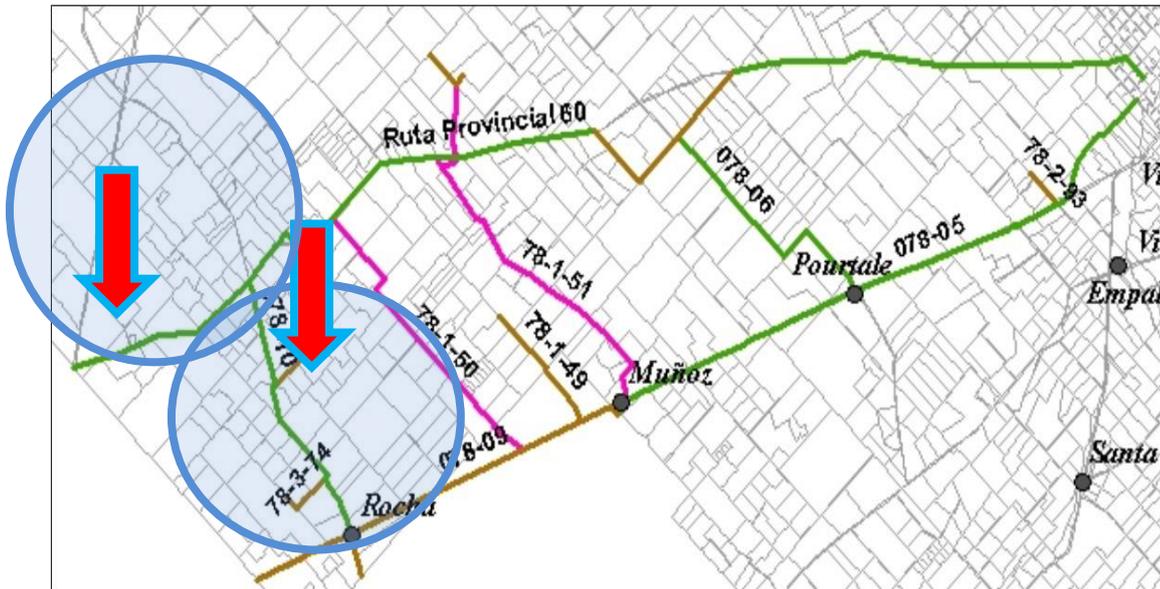

MOTONIVELADORA 1: Este equipo actualmente se encuentra reconfigurando el camino 78-2-53 (San Quilco – La Pepa) y alteando las partes bajas de tierra. Se evaluará la semana próxima el recorrido a realizar dependiendo de las condiciones de humedad. Se prevé ir bajando por ruta 60 e ingresar en caminos transversales y en la medida que el clima continúe sin precipitaciones, ir mejorando las cunetas y alteando las trazas de los caminos.





Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12



Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12



MOTONIVELADORA 2: Este equipo realizó tareas de alteo y reconformado de cunetas en el camino 078-07 (La Irene) solo en el tramo de tierra. Además, se logró intervenir el camino 78-3-68 (La tigre).

Se espera que este equipo pueda la semana próxima sumarse a la obra del camino 78-3-37b (camino a 16 de julio – Zona El Perdido), donde se desparramará el material aportado por la retroexcavadora municipal, y además se comenzara a levantar algunos tramos que no tienen cunetas y son dañados constantemente por el agua.



MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS: Continúan a buen ritmo las tareas de reparación, limpieza y mantenimiento de alcantarillas. Para ello se dividió el partido en dos grandes zonas, las cuales están a cargo de la empresa LECON SA.

Al igual que la semana anterior, uno de los equipos de trabajo se encuentra en la zona de Muñoz, con limpieza de alcantarillas y colocación de tubos nuevos. El otro equipo inicio esta semana el recorrido en la zona de Recalde, y se espera ir avanzando en dirección Iturregui – Mápis.



De esta manera, la red vial del partido de Olavarría contó esta semana con 9 motoniveladoras, 2 retroexcavadoras, un compactador autopropulsado, 2 retropala y 7 camiones tipo tatú.

Como siempre, cabe aclarar que hay sectores de la traza de un camino que no se intervendrán en tanto y en cuanto la inspección lo crea conveniente, dependiendo de su estado.

La dirección queda abierta a sugerencias y atenta siempre a las reflexiones que puedan surgir en cuanto a disposición de equipos o realización de tareas, a fin de garantizar la eficiencia de recursos. Además, se recuerda que ante reclamos se puede concurrir a la oficina de obras rurales en el Municipio, o bien comunicarse telefónicamente, donde alguien de nuestro equipo lo atenderá y nos pondremos en contacto para abordar la problemática.

Saluda atte.

ING. Mariano Arrignon

DIRECTOR DE OBRAS RURALES

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

OLAVARRIA, 24 de enero de 2025.
